工事名
　東山跨道橋補強工事(その6)及び補修工事
工事場所
　名古屋市守山区東山地内
工　期
　令和4年8月1日(実工期10月3日)～令和6年2月15日
工事請負社
　株式会社　成瀬組

工事詳細
　東山跨道橋（北側）橋長５４．７ｍ　全幅員１１．２ｍ
　　（南側）橋長５４．７ｍ　全幅員　９．１ｍ

【工事１ 東山跨道橋補強工事】
　変位制限装置工（Ｐ２橋脚）７基
　橋脚補強工（Ｐ２橋脚）（ＰＣＭ巻立）１基

【工事２ 東山跨道橋補修工事】
（北側）舗装工
　橋面防水工＋橋面舗装工 改Ⅲ―Ｗ 密８ ４５４ｍ２
（南側）舗装工
　橋面防水工＋橋面舗装工 改Ⅲ―Ｗ 密８ ４５４ｍ２
　橋面防水工＋橋面舗装工 密４ １７５ｍ２
（北側）橋梁付属物工
　伸縮装置取替工（A1 橋台車道部）８．３ｍ
　伸縮装置取替工（A2 橋台車道部）８．３ｍ
（南側）橋梁付属物工
　伸縮装置取替工（A1 橋台車道部）８．３ｍ
　伸縮装置取替工（A2 橋台車道部）８．３ｍ
　伸縮装置取替工（A1 橋台歩道部）３．２ｍ
　伸縮装置取替工（A2 橋台歩道部）３．２ｍ
（北側）（南側）橋梁補修工
　ひび割れ補修工（床版、橋台、橋脚）１式
　断面修復工（床版、橋台、橋脚、防護柵）１式

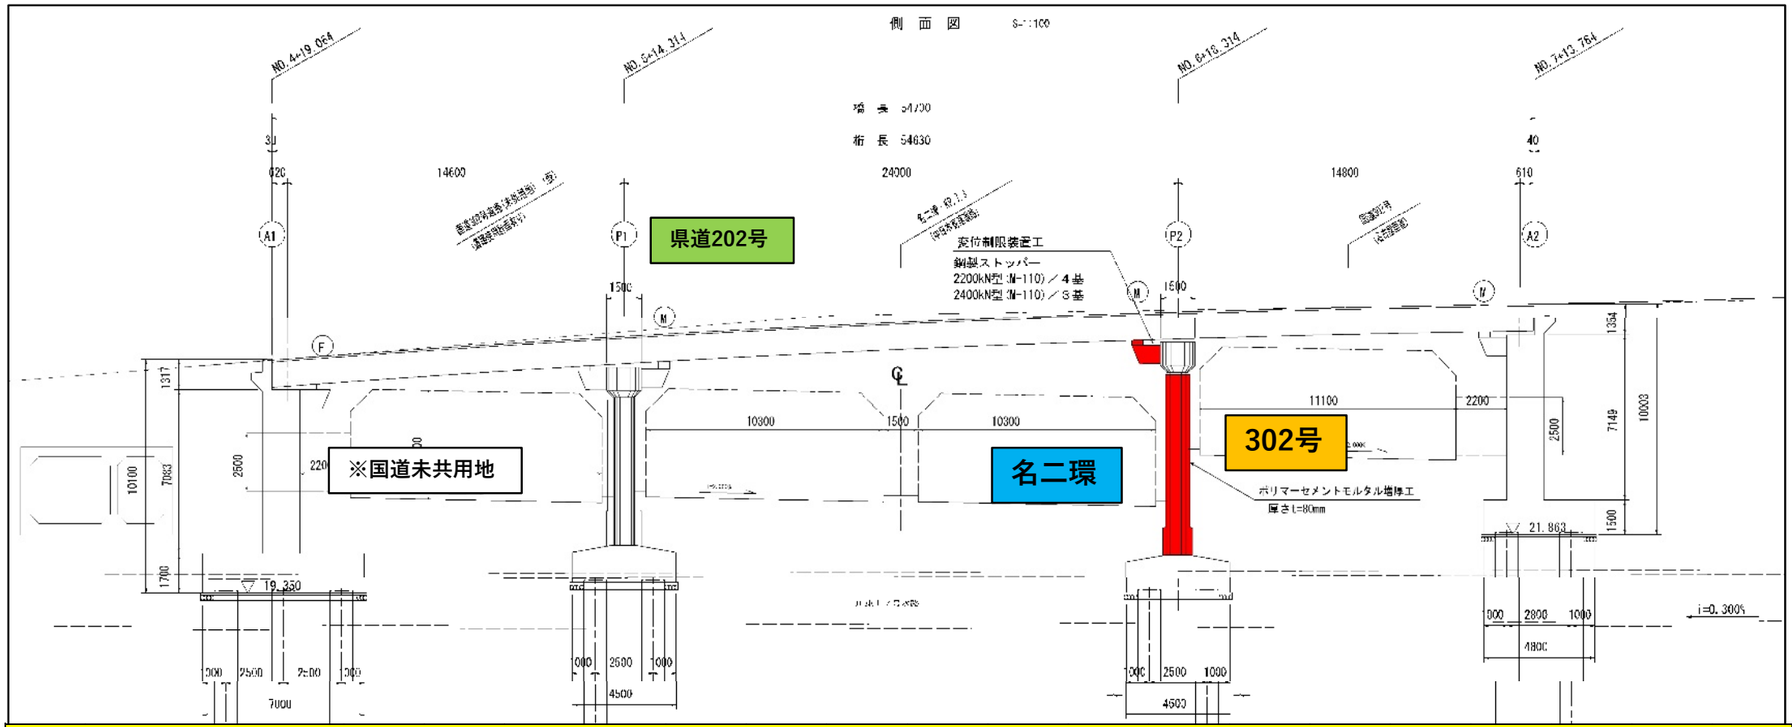

工程表

工種・種別		令和4年			令和5年											令和6年		
		10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
国道302号	準備工（施設撤去・切り回し）																施設		
	仮設工（ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ・足場）				掘削・土留・足場設置							土留・足場設撤去・埋戻					および		
	橋脚補強および補修																線形復旧		
名二環	準備工（施設撤去・切り回し）																		
	仮設工（ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ・足場）							掘削・土留・足場設置				土留・足場設撤去・埋戻							
	橋脚補強および補修																		
	落橋防止装置																		
県道202号	伸縮装置取替工																		
	橋面舗装工																		
